Hadley Mixed use
Legacy
3 wk Look ahead
3-16-2015

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	**Excavation**	**11 days**	**Mon 3/16/15**	**Mon 3/30/15**
2	Cap Brake/Stego Rem Dock Slab	3 days	Mon 3/16/15	Wed 3/18/15
3	Excavate Footings SE LP	1 day	Mon 3/16/15	Mon 3/16/15
4	Backfill/Grade NE	5 days	Mon 3/16/15	Fri 3/20/15
5	Pipe Trenching NE	5 days	Thu 3/19/15	Wed 3/25/15
6	Vapor Barrier/Cap Break NE	5 days	Tue 3/24/15	Mon 3/30/15
7	Backfill 5 Line	7 days	Thu 3/19/15	Fri 3/27/15
8	Exc Srair 4 ftg	1 day	Fri 3/20/15	Fri 3/20/15
9				
10	**Waterproofing**	**3 days**	**Mon 3/16/15**	**Wed 3/18/15**
11	Clean/Prep Building Separation Walls	2 days	Mon 3/16/15	Tue 3/17/15
12	Apply Epro System B/7/H.5 Line	1 day	Wed 3/18/15	Wed 3/18/15
13				
14	**Utilities**	**4 days**	**Mon 3/16/15**	**Thu 3/19/15**
15	Water Main Sleeves	4 days	Mon 3/16/15	Thu 3/19/15
16				
17	**Underslab Piping**	**10 days**	**Mon 3/16/15**	**Fri 3/27/15**
18	Northeast Storm/Slab Drainage	7 days	Thu 3/19/15	Fri 3/27/15
19	Trench Drain NE Entry	2 days	Thu 3/26/15	Fri 3/27/15
20	Sleeve Water mains	1 day	Mon 3/16/15	Mon 3/16/15
21				
22	**CIP Concrete**	**21 days**	**Mon 3/16/15**	**Mon 4/13/15**
23	F&P Walls/Columns Level P NE	5 days	Mon 3/16/15	Fri 3/20/15
24	Shotcrete SW Corner	1 day	Mon 3/23/15	Mon 3/23/15
25	Form Perimeter for SOG El 98	1 day	Mon 3/16/15	Mon 3/16/15
26	Pour SOG Elev 98	1 day	Fri 3/20/15	Fri 3/20/15
27	Pour Srair 4 Ftg	3 days	Mon 3/23/15	Wed 3/25/15
28	Pour SOG NE	1 day	Tue 3/31/15	Tue 3/31/15
29	Sawcut	1 day	Wed 4/1/15	Wed 4/1/15
30	L1 Deck Shoring NW	10 days	Mon 3/16/15	Fri 3/27/15
31	Pour L1 PT NW	1 day	Mon 3/30/15	Mon 3/30/15
32	Stress/Strip	7 days	Fri 4/3/15	Mon 4/13/15

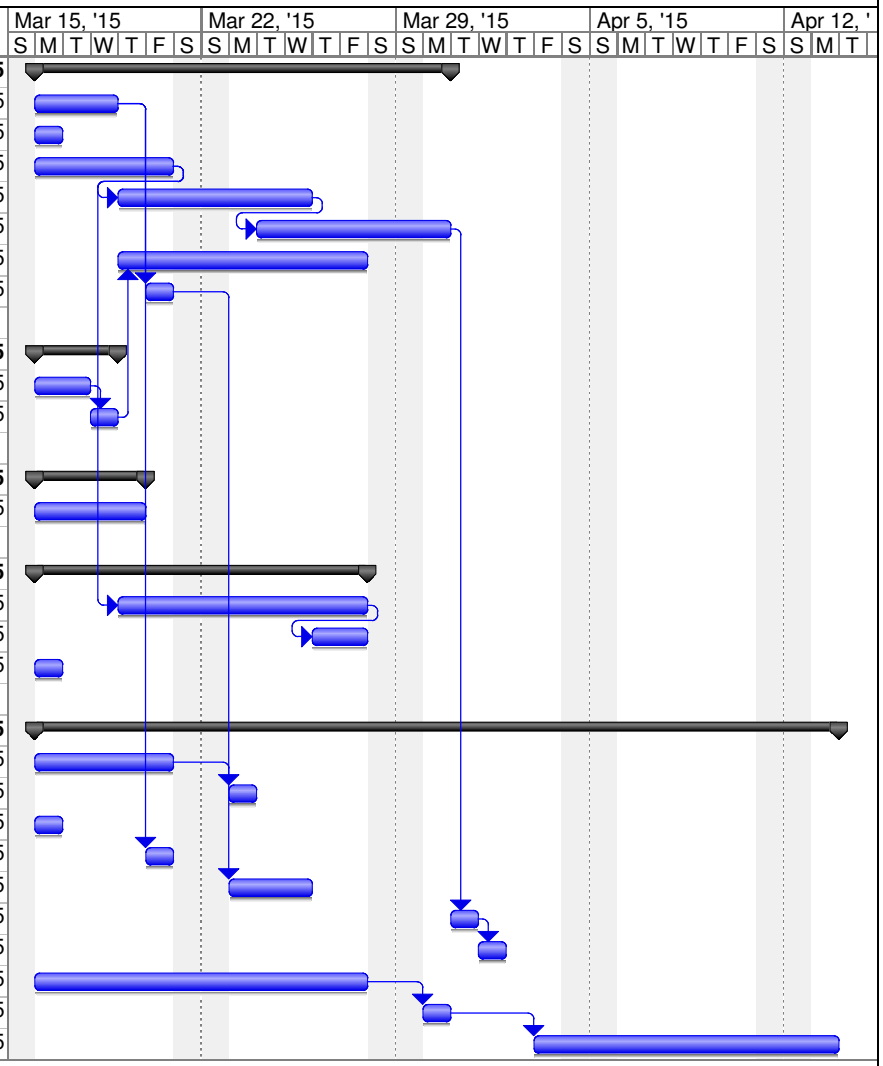

Project: 3wk look ahead 3-16-15
Date: Fri 3/13/15

Task		Milestone		External Tasks	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	
