Hadley Mixed use
Legacy
3 wk Look ahead
3-09-2015

ID		Task Name	Duration	Start	Finish
1		**Excavation**	**14 days**	**Mon 3/9/15**	**Wed 3/25/15**
2		Excavate Footings M Line/Entry	1 day	Mon 3/9/15	Mon 3/9/15
3		Backfill/Grade NW	1 day	Mon 3/9/15	Mon 3/9/15
4		Pipe Trenching NW	1 day	Mon 3/9/15	Mon 3/9/15
5		Vapor Barrier/Cap Break NW	3 days	Mon 3/9/15	Wed 3/11/15
6		Backfill/Grade NE	6 days	Thu 3/12/15	Wed 3/18/15
7		Pipe Trenching NE	5 days	Tue 3/17/15	Mon 3/23/15
8		Vapor Barrier/Cap Break NE	3 days	Mon 3/23/15	Wed 3/25/15
9					
10		**Waterproofing**	**4 days**	**Wed 3/18/15**	**Mon 3/23/15**
11		Clean/Prep Building Separation Walls	3 days	Wed 3/18/15	Fri 3/20/15
12		Apply Epro System NE	1 day	Mon 3/23/15	Mon 3/23/15
13					
14		**Utilities**	**4 days**	**Mon 3/9/15**	**Thu 3/12/15**
15		Domestic/Fire Roughin to FC Room	4 days	Mon 3/9/15	Thu 3/12/15
16		Lights on Crane	1 day	Mon 3/9/15	Mon 3/9/15
17					
18		**Underslab Piping**	**12 days**	**Mon 3/9/15**	**Mon 3/23/15**
19		North/West Storm/Slab Drainage	2 days	Mon 3/9/15	Tue 3/10/15
20		North/East Storm/Slab Drainage	9 days	Wed 3/11/15	Fri 3/20/15
21		Trench Drain NE Entry	1 day	Mon 3/23/15	Mon 3/23/15
22					
23		**CIP Concrete**	**16 days**	**Mon 3/9/15**	**Fri 3/27/15**
24		F&P Footings Northeast LP	4 days	Mon 3/9/15	Thu 3/12/15
25		F&P Walls/Columns Level P NE	7 days	Tue 3/10/15	Tue 3/17/15
26		PourSOG West/Ramp	1 day	Fri 3/13/15	Fri 3/13/15
27		Sawcut	1 day	Sat 3/14/15	Sat 3/14/15
28		Form Perimeter for SOG El 98	4 days	Mon 3/16/15	Thu 3/19/15
29		Pour SOG Elev 98	1 day	Fri 3/20/15	Fri 3/20/15
30		Pour SOG NE	1 day	Thu 3/26/15	Thu 3/26/15
31		Sawcut	1 day	Fri 3/27/15	Fri 3/27/15
32		L1 Deck Shoring NW	10 days	Mon 3/16/15	Fri 3/27/15

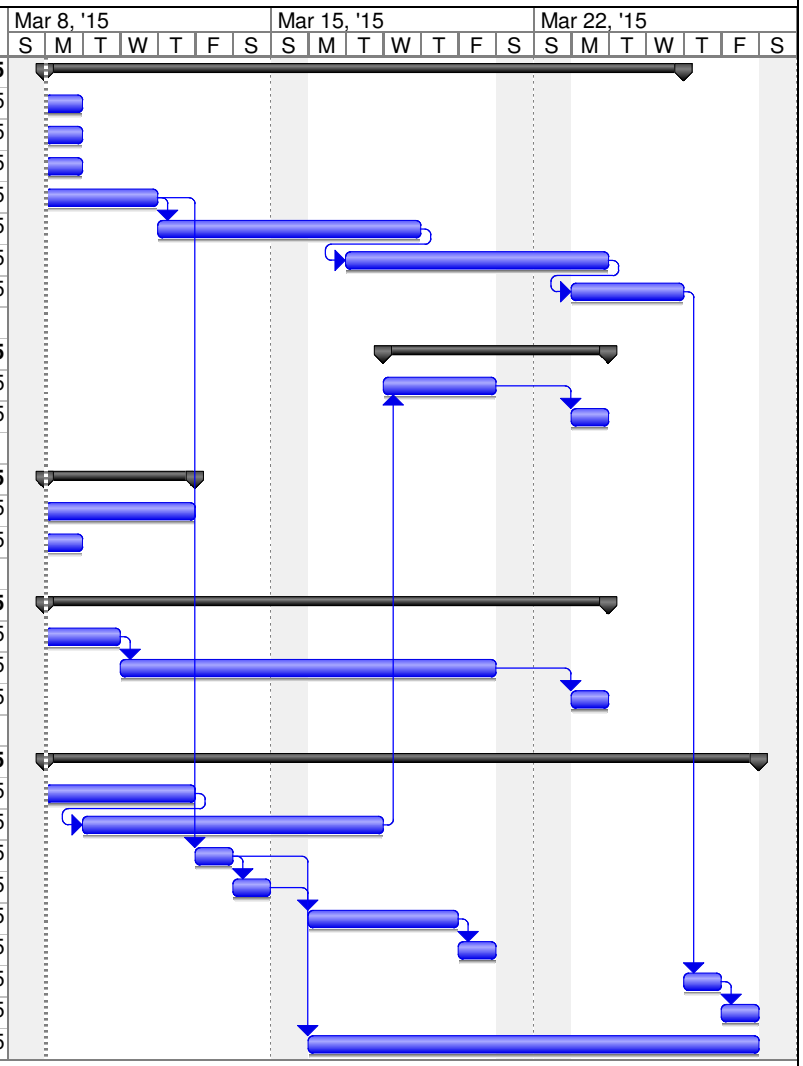

Project: 3wk look ahead 3-9-15
Date: Mon 3/9/15

Task		Milestone		External Tasks	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	
